



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTv MELLE

09/252.45.45

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 164109117108

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: LANGESTRAAT 136 b1

9300 AALST

EIGENAAR: COEYHANS CHANTAL

Adres: IDEM

OPDRACHTGEVER: IDEM

Adres: _____

INSTALLATEUR: Danny van Cauter

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 17/11/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheids onderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: WONING

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3N400 V

Bescherming van de aansluiting aut 4p/5 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm²

Alg. schakelaar: type diff 40/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 11+3

; RA: 0,20 Ohm; RI tot 500 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie één draad - en situatieschema ter plaatse.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/11/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederep. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: K. VERLEYEN
nr. + naam + handtekening

De directeur,

DAB.

DANNY VAN LA
LANGESTRAAT
APP. BELIJKHOLDERS.

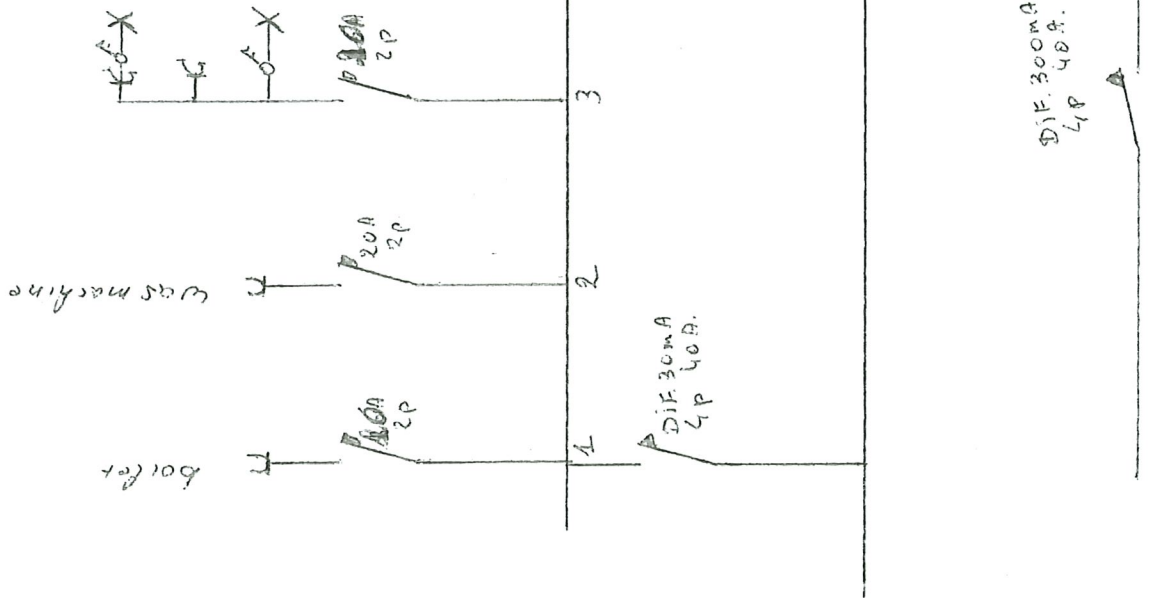


kom op 142

DAGEL. CLING

DAGEL. REUKEN

op 130/142

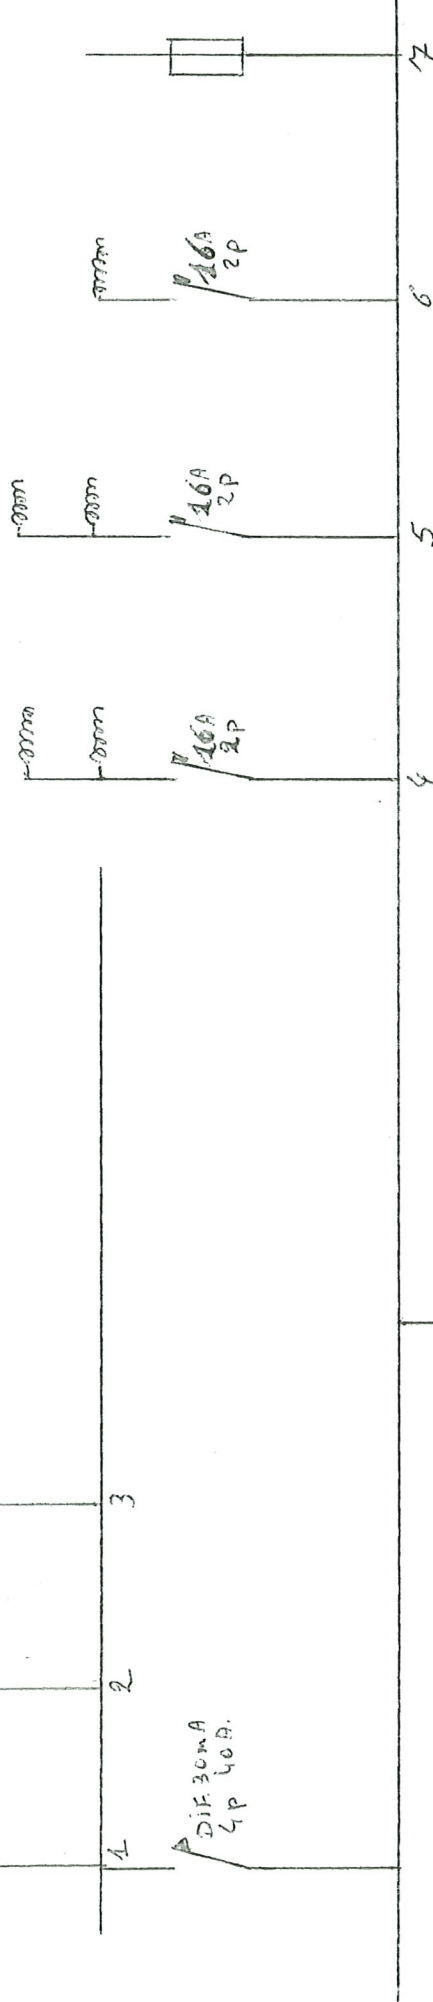

INSTALLATEUR.

DANNY VAN LAUTER.

KEURINGSE

BTV

KEURINGSOR

"13 VERLI

"18 18 17

18 17


18 17

BTV
 KEURINGSORGANI
 KRIS VERLEYEN
 KV164 17/11/12

Verleyen


100 1 + 2.

Living.

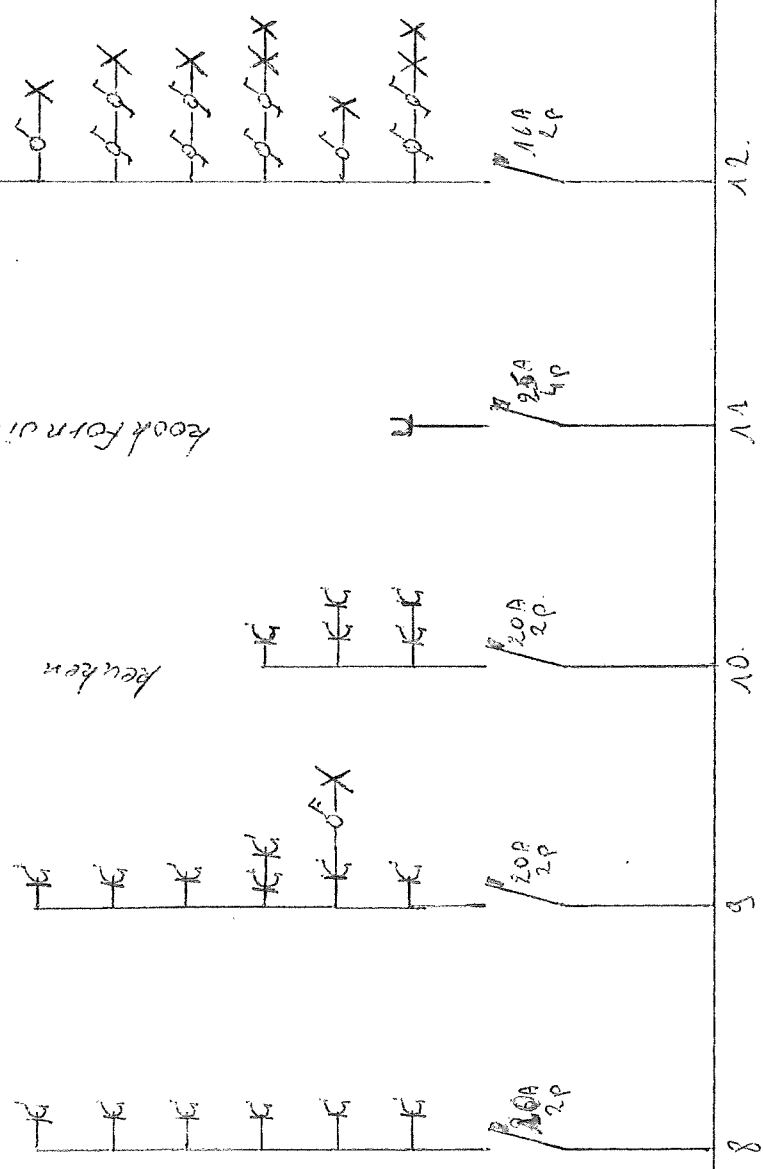

NACHT.

DANNY VAN LAUT
LANCESTRAT
APP. BEIJKULDEI

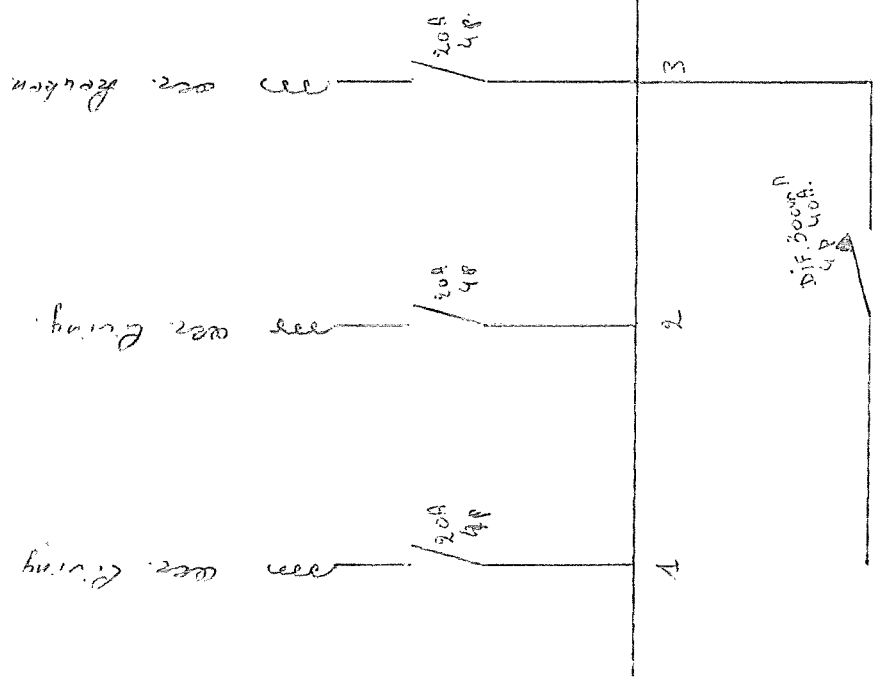

INSTALLATEUR. KEURING
DANNY VAN LAUTEN. BTV
KEURINGSORI
KRIS VERLE
KV164 171

[Signature]

2

15, 16

17/18 Wismachine } 19/20 Lötler } 21/22 backamer.
stopcontacten, verwarm-
ing, verwarming
20A (16A) 20A (16A)
2P 2P

27, 28
Lötwerk

29/30 clay keulen } 31/32 day living } 35/36 opslaanbo-
(verwarming) (verwarming) maet
16A (20A) 16A (20A) 4A 4A
2P 2P

3, 39, 40

41/42 verlichting } 43/44 living } 45/46 slaaphamer } 47/48 keulen
B, K, L, S, S1, S2, stopcontacten + verlichting buiten
16A 20A 20A (-16A) 20A
2P 2P 2P

3 keulen

20A 4P

1+2 living

DIF 300mA
4P 40A

20A 20A
4P 4P

~~20A 4P~~
